

Gestion de projet SAE 2.05: “Aménager sa chambre”



SOMMAIRE:

1. L'enjeu est contrainte de notre projet
2. Classement des critères clés et
exigences fonctionnelles
3. Plan de Réaménagement de la
Chambre et Gestion des Tâches
Associées
4. Planification des Tâches et Attribution
des Ressources
5. Les risques du projet

1.L'enjeu et contrainte de notre projet

1) Définir qui est le « demandeur »,« client»>.

Dans ce texte, les demandeurs sont les parents car ce sont eux qui nous proposent de réaménager la chambre afin de pouvoir la louer. et le client c'est nous

2) Décrire le projet en quelques phrases en commençant par un verbe à l'infinitif.

- réaménager la chambre pour pouvoir la louer après les études
- transformer la chambre en studio.
- Etre capable de louer juste après les études
- Installer les besoin prioritaire pour le futur locataire(électricité,douche,robinet)

3) Lister les contraintes et le contenu du projet y compris les limites du projet

- Dépenser moins de 7000 euros pour le réaménagement
- Transformer la chambre en studio
- date limite : juillet-août
- offre de travail:1500 euros

2. Classement des critères clés et exigences fonctionnelles

- ❖ Définir le classement pour les 3 critères clés présentés dans ce cours.

1. Pour notre étude de cas le meilleur classement pour les 3 critères présentés dans ce cours sont :

- Délai** (fin des vacances d'été)
- Coût** (7000€)
- Qualité**(studio)

- ❖ A partir de la définition du projet "Aménager sa chambre " rédiger les exigences fonctionnelles , première du CDC

2. Les exigences fonctionnelles sont :

- Installation de la douche du lavabo
- Aménagement de la chambre pour le confort
- Isolation phonique et thermique
- Adaptabilité pour les partitions musicales
- Adaptabilité au changement à venir
- Gestion du calendrier et des ressources
- Consultation et prise en compte des avis pertinents

- ❖ A partir de ces exigences définir au moins 3 objets **SMART**

3. Les objectifs **SMART** sont :

- Spécifique** : Réduire les nuisances sonores
- Time-based** : Mettre en place les solutions d'isolation avant la fin du mois d'août
- Mesurable** : Évaluer le niveau de confort à travers des retours des membres de la famille et Sonia

3. Plan de Réaménagement de la Chambre et Gestion des Tâches Associées

1. Décomposition des tâches :

- **Évaluation des besoins et des contraintes**
- **Conception du plan d'aménagement**
- **Planification du Budget et Évaluation des Options**
- **Achat des matériaux et du mobilier**
- **Installation de la douche et du lavabo**
- **Aménagement de la chambre**
- **Isolation acoustique**
- **Travaux de finition**
- **Gestion des répétitions de musique**
- **Vérification de la conformité des travaux**
- **Nettoyage et rangement**
- **Préparation pour la future location ou occupation**

2. Livrables pour chaque tâche :

1. **Évaluation des besoins et des contraintes** : Liste des besoins et contraintes identifiés.
2. **Conception du plan d'aménagement** : Plan d'aménagement détaillé.
3. **Planification du Budget et Évaluation des Options** : Rapport de Planification Budgétaire et Évaluation des Options
4. **Achat des matériaux et du mobilier** : Liste d'achat et factures.
5. **Installation de la douche et du lavabo** : Installation complète de la douche et du lavabo.
6. **Aménagement de la chambre** : Chambre aménagée selon le plan.
7. **Isolation acoustique** : Solutions d'isolation mises en place.
8. **Travaux de finition** : Travaux de peinture et de finition achevés.
9. **Gestion des répétitions de musique** : Espace pour les répétitions prêt avec isolation sonore.
10. **Vérification de la conformité des travaux** : Rapport de vérification des travaux.

11. **Nettoyage et rangement** :Chambre nettoyée et rangée.

12. **Préparation pour la future location ou occupation** :Chambre prête à être utilisée ou louée.

3. Ressources nécessaires :

- **Père et un professionnel** : Installation de la douche et du lavabo.
- **Sacha** : Aide pour l'électricité.
- **Jimmy** : Aide pour les travaux pendant la période où il est disponible.
- **Artisans** : Pour les travaux nécessitant des compétences spécifiques.
- **Magasins** : Pour l'achat des matériaux et du mobilier.
- **Copine Sonia** : Aide pour la conception de l'aménagement.
- **Équipe de musique** : Besoin d'espace pour les répétitions.

Numéro	Tâche	Ressources nécessaires	Durée	Coût	Difficulté	Remarque
1	Évaluation des besoins et des contraintes	Nous, mes parents	2 jour	0 €	3	
2	Conception du plan d'aménagement	Nous, Sonia, mon père	3 jours	0 €	4	Besoin de consensus pour le plan
3	Planification du Budget et Évaluation des Options	Nous, membres de notre famille, amis	1 semaine	0 €	3	Examiner les différentes options disponibles

4	Achat des matériaux et du mobilier et réception	mon père, les magasins	2 semaines	1500 €	3	Comparer les prix et rechercher les meilleures offres
5	Installation de la douche et du lavabo	notre père et un professionnel	2 semaines	4000 €	4	Veiller à la qualité de l'installation
6	Aménagement de la chambre	Nous ,notre père et mère , mes amis	1 semaine	200 €	3	Organiser le travail en équipe
7	Isolation acoustique	Nous,, mes amis	2 jours	150 €	4	Importance de l'isolation pour le confort
8	Travaux de finition	Nous,nos parant , mes amis	3 jours	0 €	3	Prévoir les détails esthétiques
9	Gestion des répétitions de musique	Nous, mes amis	1 jour	0 €	2	Réserver un espace approprié
10	Vérification de la conformité des travaux	Nous, mon père, mes amis	1 jour	0 €	3	Examiner chaque détail
11	Nettoyage et rangement	Nous , mon père, mes amis	1 jour	0 €	2	Assurer la propreté avant l'usage
12	Préparation pour la future location ou occupation	Nous mon père	1 jour	0 €	2	Vérifier la fonctionnalité et l'accessibilité

4. Planification des Tâches et Attribution des Ressources

1. Définir les liens ou dépendances entre les tâches que vous avez listées dans la séance précédente (WBS)

- La conception du plan d'aménagement dépend de l'évaluation des besoins et des contraintes. Avant de concevoir le plan, il est nécessaire d'évaluer les besoins et les contraintes de la chambre.
- La planification du budget et évaluation des Options dépend également de l'évaluation des besoins et des contraintes. Pour évaluer les options, il faut d'abord connaître les besoins et les contraintes pour utiliser un budget qui répond au besoin et à la contrainte de la chambre.
- L'achat des matériaux et du mobilier dépend de la planification du budget et de l'évaluation des Options. Après avoir évalué les options et planifier le budget, vous pouvez procéder à l'achat des matériaux et du mobilier.
- L'installation de la douche et du lavabo dépend de l'achat des matériaux et du mobilier. Une fois les matériaux achetés, l'installation peut commencer.
- L'aménagement de la chambre dépend de l'installation de la douche et du lavabo. Avant d'aménager la chambre, il est nécessaire d'installer les éléments essentiels comme la douche et le lavabo.
- L'isolation acoustique dépend également de l'installation de la douche et du lavabo. Certaines étapes d'isolation acoustique peuvent nécessiter l'installation de la douche et du lavabo au préalable.
- Les travaux de finition dépendent de l'isolation acoustique et de l'aménagement de la chambre. Les travaux de finition peuvent commencer une fois que l'isolation acoustique est terminée et que la chambre est aménagée.
- La gestion des répétitions de musique dépend de l'aménagement de la chambre. La chambre doit être aménagée avant de pouvoir être utilisée pour des répétitions de musique.
- La vérification de la conformité des travaux dépend des travaux de finition. Une fois les travaux de finition terminés, il est nécessaire de vérifier leur

conformité.

-Le nettoyage et rangement dépend de la vérification de la conformité des travaux. Après avoir vérifié la conformité des travaux, il est temps de nettoyer et de ranger la chambre.

- La préparation pour la future location ou occupation dépend du nettoyage et rangement. Une fois la chambre propre et rangée, elle est prête à être utilisée ou louée.

2.Affecter les ressources (humaines,matérielles) à partir des tâches et du tableau Excel fourni dans le cours précédent (WBS)

1/Évaluation des besoins et des contraintes :

- **Ressources humaines** : Nous, vos parents.
- **Ressources matérielles** : Papier, stylos, appareil photo pour documenter la chambre.

2/Conception du plan d'aménagement :

- **Ressources humaines** : Nous , Sonia et notre père .
- **Ressources matérielles** : Papier millimétré, logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO), règle, crayons.

3/Planification du Budget et Évaluation des Options :

- **Ressources humaines** : Nous, membres de la famille, amis.
- **Ressources matérielles** : Accès à Internet pour la recherche, calculatrice, tableur Excel.

4/Achat des matériaux et du mobilier :

- **Ressources humaines** : Nous, notre père , les magasins.
- **Ressources matérielles** : Moyens de paiement, véhicule pour

le transport des matériaux si nécessaire.

5/Installation de la douche et du lavabo :

- **Ressources humaines** : notre père , Sacha.
- **Ressources matérielles** : Outils de plomberie, matériaux d'installation.

6/Aménagement de la chambre :

- **Ressources humaines** : Nous, notre père , nos amis .
- **Ressources matérielles** : Outils de menuiserie, matériaux d'aménagement.

7/Isolation acoustique :

- **Ressources humaines** : Nous, notre père , nos amis .
- **Ressources matérielles** : Matériaux d'isolation acoustique (Panneaux de mousse acoustique)

8/Travaux de finition :

- **Ressources humaines** : Nous, notre père , nos amis .
- **Ressources matérielles** : Peinture, pinceaux, rouleaux, matériaux de finition.

9/Gestion des répétitions de musique :

- **Ressources humaines** : Nous, nos amis .
- **Ressources matérielles** : Instruments de musique, équipement audio.

10/Vérification de la conformité des travaux :

- **Ressources humaines** : Nous, notre père , nos amis .
- **Ressources matérielles** : Liste de contrôle, outils d'inspection.



11/Nettoyage et rangement :

- **Ressources humaines** : Nous, notre père , nos amis .
- **Ressources matérielles** : Produits de nettoyage, équipement de nettoyage.

12/Préparation pour la future location ou occupation :

- **Ressources humaines** : Nous, notre père , nos amis .
- **Ressources matérielles** : Mobilier, accessoires, décoration.

3.Créer le diagramme Gentt

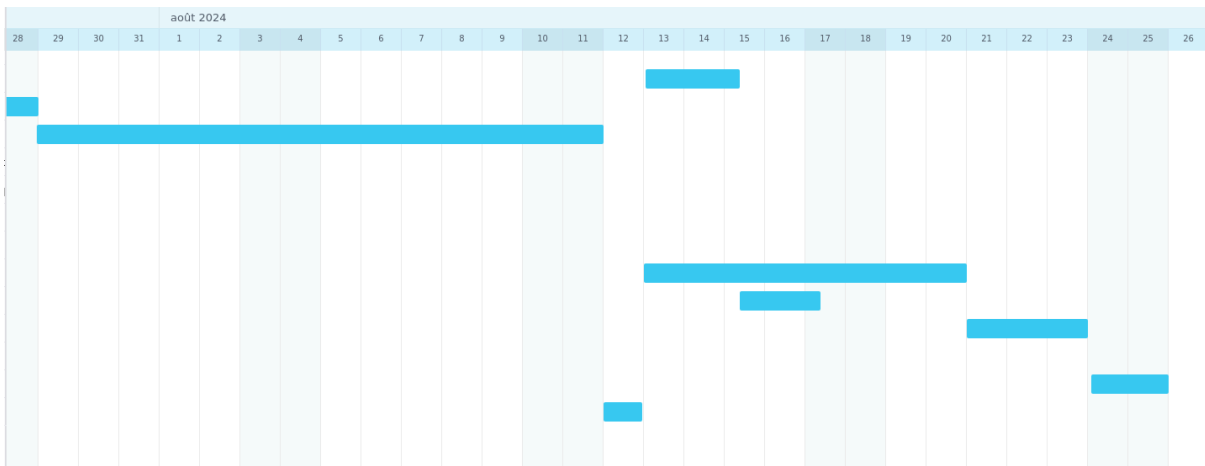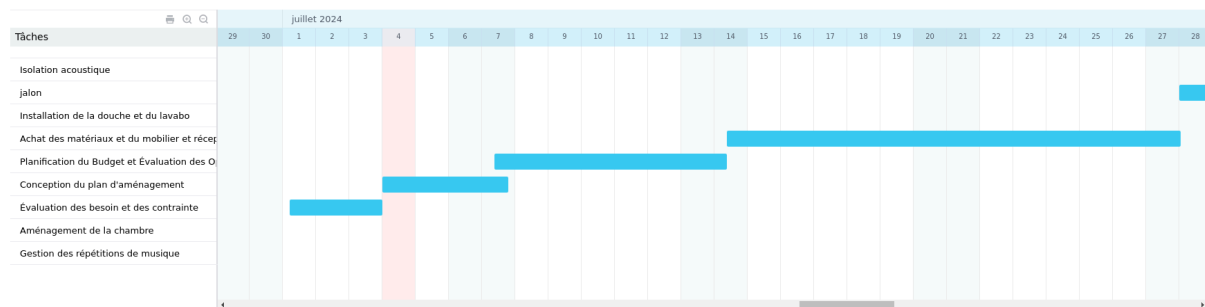

5. Les risques du projet

1. Risques Potentiels :

1. Retard dans la livraison des matériaux et du mobilier.
2. Dépassement du budget prévu.
3. Mauvaise qualité des matériaux achetés.
4. Problèmes de coordination entre les membres de l'équipe.
5. Découverte de problèmes structurels ou de plomberie lors des travaux.
6. Conflit avec le voisinage concernant le bruit ou les travaux.
7. Changements de réglementations locales affectant les autorisations et permis nécessaires.
8. Indisponibilité soudaine de ressources clés (personnel, outils).

2. Risques Sélectionnés :

1. Retard dans la livraison des matériaux et du mobilier.
2. Dépassement du budget prévu
3. Découverte de problèmes structurels ou de plomberie lors des travaux.

3. Actions Préparées :

1. Pour atténuer le risque de retard dans la livraison des matériaux et du mobilier :

- Passer les commandes plus tôt que prévu pour tenir compte des délais de livraison.
- Communiquer régulièrement avec les fournisseurs pour suivre l'état des livraisons.

2. Pour gérer le risque de dépassement du budget prévu :

- Établir un suivi financier rigoureux pour surveiller les dépenses et identifier les écarts dès qu'ils surviennent.
- Établir des marges de sécurité dans le budget pour faire face à d'éventuels coûts imprévus.

3. Pour faire face à la découverte de problèmes structurels ou de plomberie lors des travaux :

- Prévoir un budget et un calendrier flexibles pour les réparations ou les modifications nécessaires.
- Avoir recours à des professionnels qualifiés pour évaluer et résoudre les problèmes dès leur découverte.

4. Effets des Actions sur les Critères Clés :

1. **Sur le temps** : En anticipant les retards potentiels et en gérant efficacement les problèmes, les actions préparées minimisent l'impact sur les délais du projet.
2. **Sur le coût** : Les actions proposées contribueront à limiter les effets du dépassement budgétaire potentiel en surveillant étroitement les dépenses et en prévoyant des marges de sécurité.
3. **Sur la qualité** : En faisant appel à des professionnels qualifiés pour résoudre les problèmes identifiés, la qualité globale du projet sera préservée malgré les imprévus.

5. Impact du Coût en cas de Confrontation aux Risques :

1. **Retard dans la livraison des matériaux et du mobilier** : Les coûts supplémentaires peuvent provenir de la nécessité de prolonger les délais de travail ou de louer des équipements supplémentaires pour compenser.

2. **Dépassement du budget prévu** : Les coûts supplémentaires seront directement liés aux dépenses excédentaires par rapport aux prévisions budgétaires initiales, ce qui peut affecter la rentabilité globale du projet.
3. **Découverte de problèmes structurels ou de plomberie lors des travaux** : Les coûts supplémentaires seront engendrés par des réparations ou des modifications nécessaires pour corriger les problèmes identifiés, ce qui peut entraîner des dépenses imprévues et potentiellement significatives.
